valvic
MARCENARIA


Linha do tempo da obra

ATTOS HENRIQUE SALLES · ESCRITÓRIO · COSTA LAGUNA · ALPHAVILLE, NOVA LIMA

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA
10/12/2026

1 · O CAMINHO ATÉ A ENTREGA, DIA A DIA

DE 11/11 A 10/12/2026 · FINS DE SEMANA SOMBREADOS

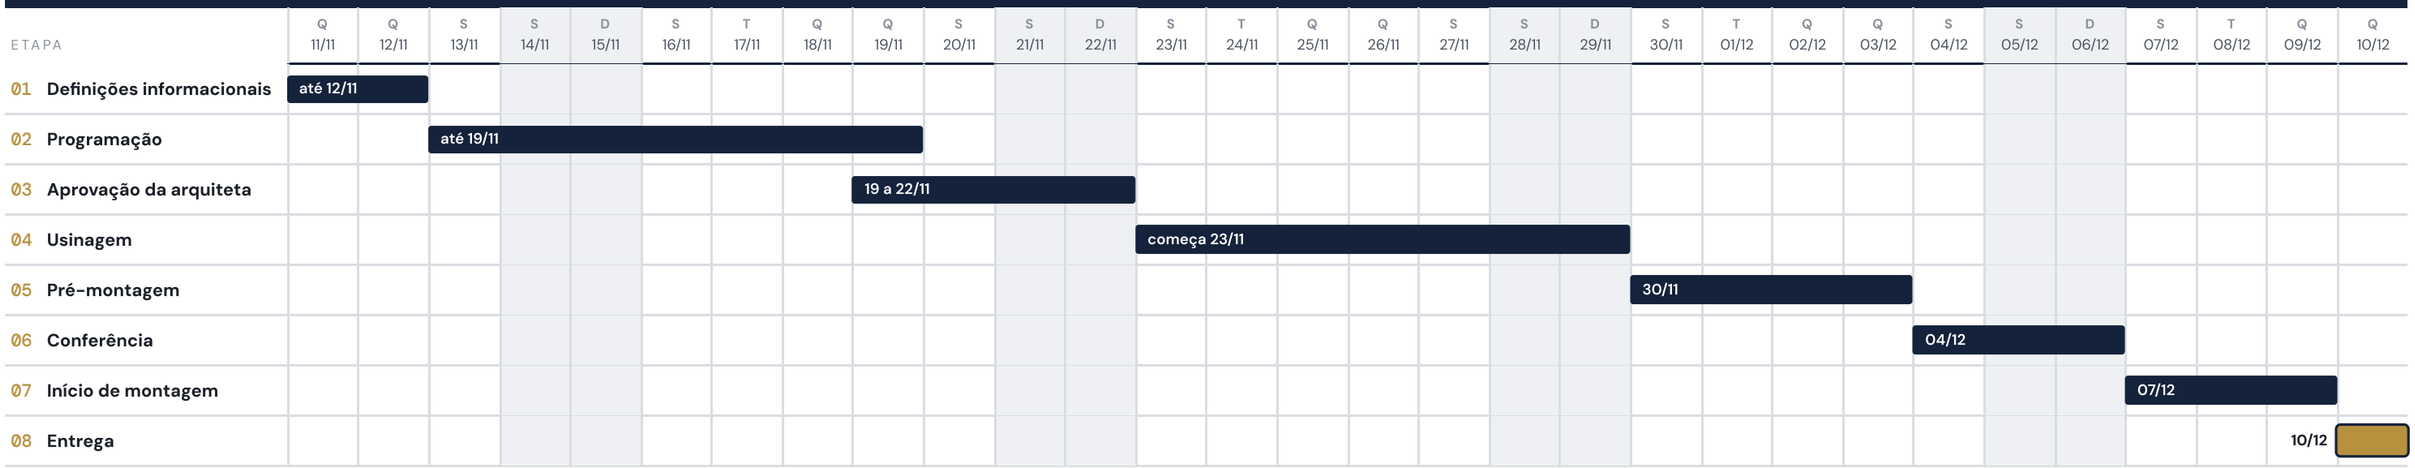

2 · ACOMPANHAMENTO DE CADA ETAPA

MARQUE A CAIXA AO CONCLUIR · ANOTE À MÃO O QUE A ETAPA PRECISA

01 · Definições informacionais

até 12/11

Tudo o que o executivo precisa saber antes de ser desenhado.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Cores e padrões de MDF definidos com o cliente, antes de comprar chapa
- [ ] Perfil de alumínio na base do painel ripado: levar ao cliente em protótipo
- [ ] Divergência entre o render e o executivo resolvida — nada corta antes

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

02 · Programação

até 19/11

Executivo de marcenaria e plano de corte.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Medição técnica no local até 13/11
- [ ] Fixação da pedra alinhada com a marmoraria — a pedra é de terceiro
- [ ] Apoio metálico da ponta da mesa desenhado — o apoio é nosso
- [ ] Painel ripado na mesma cadência da casa

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

03 · Aprovação da arquiteta

19 a 22/11

Executivo aprovado pela arquiteta.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Executivo sem a divergência do render
- [ ] Cores e perfil da base confirmados por escrito: alteração só vale por escrito

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

04 · Usinagem

começa 23/11

Corte, fita de borda, ripas e usinagem.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Janela própria na produção: fora da fila dos 70 dias da casa
- [ ] Chapa comprada nos padrões aprovados

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

05 · Pré-montagem

30/11

Armários montados e regulados na fábrica.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Corrediças Hettich com Silent System e dobradiças Hettich Novisys
- [ ] Gaveteiro do armário inferior regulado
- [ ] Ripado em painéis, com a base contínua onde os armários se fixam

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

06 · Conferência

04/12

Conferência contra o escopo · embalagem e carga.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Painel ripado, armário superior, bancada e armário inferior conferidos
- [ ] Apoio metálico da mesa pronto para a carga

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

07 · Início de montagem

07/12

Equipe na obra.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Carga e instalação em janela própria
- [ ] Marmoraria alinhada para a pedra sobre a bancada

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

08 · Entrega

10/12

Escritório instalado e conferido.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Instalado até 10/12/2026 — prazo contratual
- [ ] Termo de garantia: 10 anos marcenaria e ferragem

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

Etapa · Marco de um dia · Entrega

Bruna Castro
Arquiteta e urbanista · responsável pelo projeto

Produção
Visto em ___/___/_____

Gestão
Visto em ___/___/_____
