



VALVIC MARCENARIA

Vargas Decor Ltda · CNPJ 17.269.304/0001-51 · Belo Horizonte / MG



VOLUME ÚNICO · 2026

Caderno *Empresarial*

A empresa reunida num só documento: a posição comercial, a estrutura de pessoas, a economia da operação, o passivo trabalhista e os caminhos de expansão — cada assunto com os números abertos e as decisões postas na mesa.

R\$ 827k

CARTEIRA ATIVA
18 PROJETOS

R\$ 1,06 mi

PIPELINE
EM NEGOCIAÇÃO

+133%

CRESCIMENTO
2023 → 2025

R\$ 1 mi

HORIZONTE
POR MÊS

COMO ESTE CADERNO ESTÁ ORGANIZADO

Sumário

Cinco partes, da posição de hoje aos caminhos de crescimento. Cada parte abre com uma página de contexto e reúne o material que já existia em documentos separados.

I

A EMPRESA HOJE

4 páginas

Identidade, trajetória e capacidade instalada

· o que já existe e está pago

05

Panorama comercial — posição de 25/07

· carteira, recebido e composição

06

Carteira ativa, projeto a projeto

· 18 projetos · R\$ 827 mil

07

Pipeline e cronograma de conclusão

· R\$ 1,06 mi em negociação

08

II

ESTRUTURA & PESSOAS

5 páginas

Organograma e carga operacional dos sócios

· onde tudo converge hoje

10

Quadro de pessoal e folha mensal

· vínculo, fixo e variável por pessoa

11

Estrutura de demandas

· o que existe, o que entra, o que falta

12

Fluxo de trabalho — posição e impacto

· a cadeia de valor em 6 etapas

13

III

ECONOMIA DA OPERAÇÃO

3 páginas

Modelo econômico e alavancagem operacional

· o que cada nível de volume gera

15

Custo da estrutura e investimento

· folha, benefícios e CAPEX mapeado

16

IV

PASSIVO TRABALHISTA

2 páginas

Apuração por contrato

· verbas, encargos e perímetro

18

V

CAMINHOS DE EXPANSÃO

9 páginas

A escada de produção

· de R\$ 250 mil a R\$ 1 milhão por mês

20

Galpão: adaptar o atual ou mudar

· os dois caminhos, com custos abertos

21

Comparativo de coladeiras

· cinco opções lado a lado

22

Linha industrial e complementares

· nesting, furação, esteira e embaladora

23

Diferencial de mercado — puxadores

· margem por posicionamento

24

Prestação de serviços

· a capacidade ociosa como receita

25

Plano de expansão 2026–2027

· fases, máquinas e mapa do investimento

26

Retorno e payback

· cenários conservador e de capacidade

27

NOTA DE LEITURA

Este caderno **compila** documentos produzidos entre junho e agosto de 2026, cada parte preservando os números e as datas da sua origem — por isso convivem aqui referências de períodos diferentes, sempre identificadas. Onde duas fontes adotam premissas distintas, a divergência está **sinalizada em vez de resolvida**. Valores de máquina são **de feira**: referências de negociação, a confirmar na proposta final de cada fornecedor.

O DOCUMENTO

O que este caderno reúne

Uma leitura contínua da empresa: onde ela está, com quem opera, quanto custa, o que deve e para onde pode ir.

A Valvic é uma marcenaria industrial de móveis planejados sob medida em Belo Horizonte, operando sob a razão social **Vargas Decor Ltda**. Cresceu **133% entre 2023 e 2025** — de R\$ 645 mil para R\$ 1,5 milhão ao ano — **sem aporte externo de capital**, e chegou a 2026 com um parque produtivo instalado e majoritariamente quitado.

O material que segue foi produzido ao longo de junho, julho e agosto de 2026 em documentos separados, cada um respondendo a uma pergunta específica. Reunidos aqui, eles formam um retrato único: **a carteira que está em execução, as pessoas que fazem a operação girar** e o que ela custa, **a economia que sustenta o negócio, o passivo trabalhista acumulado** e **os caminhos de expansão** com os investimentos abertos item a item.

A EMPRESA EM NÚMEROS

posição consolidada · agosto de 2026

CARTEIRA ATIVA

R\$ 827,4 mil

18 projetos em execução · tickets de R\$ 5,3k a R\$ 117k

JÁ RECEBIDO

R\$ 321,2 mil

39% do valor vendido, em caixa

PIPELINE

R\$ 1,06 mi

1,3× a carteira já em execução

PARQUE PRODUTIVO

R\$ 506 mil

Instalado e em grande parte quitado

EQUIPE

8 + 2 sócios

3 entrando · 4 a 5 contratações abertas

CUSTO DA ESTRUTURA

R\$ 58,0 mil/mês

A partir do próximo mês · hoje R\$ 47,5 mil

PASSIVO TRABALHISTA

R\$ 28,7 mil

6 contratos encerrados · perímetro definido

HORIZONTE

R\$ 1 mi/mês

Meta aspiracional · hoje o teto é ~R\$ 250 mil

COMO LER AS CINCO PARTES

PARTES I E II · O RETRATO

Onde a empresa está e com quem

A carteira em execução, projeto a projeto, e a estrutura de pessoas que a entrega — com a folha aberta por colaborador e o mapa de quem responde a quem. É a fotografia do presente.

PARTES III E IV · A CONTA

Quanto rende e quanto deve

A alavancagem operacional — por que cada real novo de volume converte desproporcionalmente em resultado — e o passivo trabalhista apurado contrato a contrato.

PARTE V · A DECISÃO

Os caminhos de expansão, com os custos abertos

De R\$ 250 mil a R\$ 1 milhão por mês, em degraus. Cada degrau com o seu gatilho de demanda, o gargalo que ataca e o investimento que exige. As máquinas com ficha técnica e preço; o galpão com os dois caminhos possíveis. **Não há recomendação** — há caminhos, custos e trade-offs postos lado a lado para que a decisão seja informada.

P A R T E U M

A Empresa Hoje



O que já existe, está instalado e está pago — e o que a empresa tem em execução neste momento. Uma marcenaria que dobrou de tamanho em dois anos sem capital externo e que hoje opera próxima do seu teto de capacidade, com uma carteira de 18 projetos e um pipeline maior que a própria carteira.

-
- 05** Identidade, trajetória e capacidade instalada
 - 06** Panorama comercial — posição de 25 de julho
 - 07** Carteira ativa, projeto a projeto
 - 08** Pipeline e cronograma de conclusão

IDENTIDADE & CAPACIDADE

A máquina já está construída

A Valvic não é uma promessa a construir: é uma operação instalada, paga e com histórico. O que ela tem de capacidade supera o que fatura.

PARQUE PRODUTIVO INSTALADO

R\$ **506 mil**

Máquinas, ferramentas e infraestrutura — em grande parte quitado

CRESCIMENTO 2023 → 2025

+133%

De R\$ 645 mil para R\$ 1,5 milhão ao ano, sem capital externo

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

43,5%

Referência do modelo econômico de jun/2026

OS QUATRO ATIVOS QUE O CAPITAL NÃO COMPRA RÁPIDO

ATIVO	POR QUE VALE	SITUAÇÃO
Parque de máquinas	CNC, esquadrejadeira, coladeira e exaustão — corte e usinagem em padrão industrial	INSTALADO · PAGO
Equipe formada	Marceneiros, operador de máquinas, programador CNC e coordenação de produção	EM OPERAÇÃO
Marca & carteira	Reputação de planejados sob medida em BH, com base de clientes recorrente e indicação ativa	ATIVA
Processo & track record	Dobrou de tamanho em dois anos sozinha — sabe produzir e sabe entregar	COMPROVADO

INVENTÁRIO DO PARQUE INSTALADO

todos quitados

EQUIPAMENTO	PAPEL HOJE	PAPEL NA LINHA EXPANDIDA
Raizen Solid TAF Centro de usinagem CNC · 380V · 3 eixos	Nesting e usinagens especiais, dividindo tempo entre as duas — ~35 chapas/dia	Passa a fazer só usinagens especiais , liberada pela CNC nesting dedicada
SCM minimax me 25 Coladeira de bordas · fita 0,4 mm · cola EVA	Coladeira principal · atende até ~R\$ 300 mil/mês e não finaliza 100% a peça	Vira backup da nova — garante uptime, elimina ponto único de falha
Raizen RZN 3200P Esquadrejadeira	Cluster de corte	Mantém a função de corte
Ferramental & infraestrutura Tupia, serra, coletores, pneumático, bancadas	Apoio de produção	Mantém, somado ao compressor novo da linha

PRINCÍPIO ADOTADO

Nenhuma máquina atual será vendida ou descartada. Cada equipamento ganha um papel novo na linha expandida — a Solid TAF deixa de brigar entre nesting e especiais, e a me 25 vira redundância. O ganho imediato é que **o corte deixa de ser o gargalo**.

A LEITURA DE FUNDO

Um concorrente que quisesse partir do zero precisaria desembolsar **~R\$ 500 mil só em máquinas e dois anos para provar a operação**. A Valvic já tem os dois. A margem de 43,5% significa que cada projeto contribui com 43 centavos de cada real para cobrir estrutura e gerar lucro — **o que limita o resultado não é a margem, é a quantidade de projetos**.

A carteira em execução

Quanto foi vendido, quanto já entrou em caixa e em que estágio de produção está cada real vendido.

CARTEIRA ATIVA (VENDIDO)

R\$ 827 mil

18 projetos em execução - tickets de R\$ 5,3k a R\$ 117k

RECEBIDO ATÉ AGORA

R\$ 321 mil

39% do valor vendido já em caixa

RECEITA BRUTA PENDENTE

R\$ 506 mil

61% do vendido, conforme a entrega avança

PIPELINE EM NEGOCIAÇÃO

R\$ 1,06 mi

R\$ 240k em fase final + R\$ 820k em 2 contas grandes

ONDE ESTÁ O VALOR VENDIDO HOJE

% da carteira ativa de R\$ 827 mil

ENTREGUE AO CLIENTE

R\$ 274,9 mil

33% DA CARTEIRA

Já nas mãos do cliente. É a parcela que sustenta o recebimento e libera as parcelas finais de contrato.

FABRICADO, AGUARDANDO ENTREGA

R\$ 68,5 mil

8% DA CARTEIRA

Pronto na fábrica e ainda não entregue — depende de agenda de obra, veículo e equipe de montagem.

AINDA A FABRICAR

R\$ 484,0 mil

59% DA CARTEIRA

A maior parte do que foi vendido ainda precisa passar pela fábrica. É o que dimensiona a carga de produção dos próximos meses.

CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO

quando cada bloco da carteira fecha

JÁ ENTREGUE

R\$ 87k

André · Alphaville — entregue, com cobrança em aberto.

PRÓXIMA SEMANA

R\$ 44k

Fechamentos imediatos, com peças já fabricadas.

ATÉ FINAL DE AGOSTO

R\$ 321k

O maior bloco de conclusão do trimestre.

EM SETEMBRO

R\$ 375k

Concentra os projetos de casa completa e clínica.

COMO LER OS PERCENTUAIS

Entregue = já nas mãos do cliente. Fabricado = pronto na fábrica, ainda não entregue. A fabricar = falta produzir. Os percentuais são sempre em relação ao valor vendido de cada projeto. Entre a posição anterior e esta, a carteira passou de 13 para 18 projetos (R\$ 711k → R\$ 827k) e o recebido subiu de 34% para 39%. Análise a partir da posição informada pelo comercial — não substitui o fechamento financeiro.

CARTEIRA ATIVA • 25/07/2026

Projeto a projeto

Os 18 projetos em execução, com valor vendido, recebido e o estágio de produção de cada um.

CLIENTE	AMBIENTE(S)	VENDA R\$	RECEBIDO	ENTREGUE	FABRICADO	A FABRICAR	ENTREGA PREVISTA
Augusto	Diversos	90.000	63.000 (70%)	70%	—	30%	1ª quinz. ago
Maria • Vale dos Cristais	Diversos	117.000	58.000 (50%)	70%	—	30%	final de set.
André • Alphaville	Diversos	87.000	0 (0%)	100%	—	—	entregue • cobrança em aberto
Cristiane	Diversos	94.000	41.951 (45%)	—	50%	50%	1ª quinz. ago
Simony	Diversos	34.000	34.000 (100%)	—	0%	100%	2ª quinz. ago
Bernardo	Cozinha e banheiro	13.000	4.000 (31%)	—	100%	—	final de ago.
Carla	Cozinha	27.000	13.500 (50%)	—	0%	100%	final de ago.
Lucas Mello	Diversos	46.000	24.000 (52%)	20%	—	80%	1ª quinz. ago
Luciana Rajão • V. dos Cristais	Manutenções diversas	12.000	0 (0%)	0%	—	100%	2ª quinz. ago
Ana Carolina	Casa completa	108.000	32.500 (30%)	0%	—	100%	início de set.
Richard	Quarto	22.000	11.000 (50%)	0%	—	100%	início de set.
Andrea	Clínica dermatologia	47.000	14.000 (30%)	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Giseli • Vale do Sereno	Banheiros	14.000	7.000 (50%)	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Luiz • adv.	Diversos	5.300	0 (0%)	0%	—	100%	final de ago.
Leonardo • Alphaville	Diversos	55.000	0 (0%)	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Rejane	Diversos	35.600	14.000 (39%)	95%	—	5%	a concluir
Tania	Diversos	8.500	4.250 (50%)	—	100%	—	próxima semana
Flavia	Diversos	12.000	0 (0%)	0%	—	100%	início de set.
Total da carteira ativa		827.400	321.201 (39%)	33%	8%	59%	—

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

Os cinco maiores projetos — Maria (R\$ 117k), Ana Carolina (R\$ 108k), Cristiane (R\$ 94k), Augusto (R\$ 90k) e André (R\$ 87k) — somam **R\$ 496 mil**, ou **60% de toda a carteira**. Os treze restantes dividem os R\$ 331 mil finais.

PONTOS DE ATENÇÃO

- **André • Alphaville — R\$ 87 mil.** Projeto 100% fabricado e entregue com **cobrança integralmente em aberto**. É o maior valor a receber isolado da carteira.
- **Rejane** segue sem prazo de conclusão definido, com 95% já fabricado.

PIPELINE · FORA DA CARTEIRA

O que está em negociação

R\$ 1,06 milhão em conversas abertas — 1,3 vez a carteira que já está em execução.

PIPELINE TOTAL

R\$ 1,06 mi

Fora da carteira ativa de R\$ 827 mil

FASE FINAL DE NEGOCIAÇÃO

R\$ 240 mil

Alta probabilidade de conversão

DUAS CONTAS GRANDES

R\$ 820 mil

Construtora e condomínio · ciclo mais longo

FASE FINAL DE NEGOCIAÇÃO

alta probabilidade · R\$ 240 mil

CONTA	VALOR	SITUAÇÃO
Juliana	R\$ 120.000	Maior valor individual do bloco de conversão próxima.
Marcelo Tolentino	R\$ 85.000	Negociação avançada.
Cristiane	R\$ 35.000	Ampliação de escopo sobre projeto já em execução na carteira.
Subtotal em fase final	R\$ 240.000	

CONTAS MAIS EXPRESSIVAS

R\$ 820 mil · ciclo mais longo

CONSTRUTORA · LAGOA SANTA

Junior

R\$ 370.000

Proposta **aprovada verbalmente**, pendente de alinhamento da forma de pagamento. O porte das casas que a construtora entrega é um perfil interessante para a Valvic — abre a porta para recorrência, não só para um projeto.

ALPHAVILLE VESPASIANO

Fábio & Quênia

R\$ 450.000

Cliente **mais focado na experiência de recebimento do que no valor**. O contato é difícil e a conta exige acompanhamento de perto — é o maior valor isolado do pipeline.

CARTEIRA + PIPELINE

R\$ 1,89 mi

R\$ 827 mil já contratados e em execução, somados a **R\$ 1,06 milhão em negociação**. O pipeline sozinho supera em **1,3x** tudo o que a empresa tem hoje na fábrica — e é isso que dimensiona a urgência da estrutura descrita na Parte II.

O QUE ESSE NÚMERO SIGNIFICA PARA A DECISÃO

A carteira atual já ocupa a capacidade instalada. Se apenas os **R\$ 240 mil em fase final** se converterem, a produção precisa absorver quase 30% a mais sem qualquer mudança de estrutura. Se as duas contas grandes entrarem, o volume ultrapassa o teto físico do galpão atual — que é exatamente a conversa da Parte V.

PARTE DOIS

Estrutura & Pessoas



Quem faz a operação girar, quanto custa e onde o trabalho converge. Hoje a empresa tem oito profissionais ativos além dos dois sócios — e os dois sócios atravessam quase toda a cadeia de valor, acumulando ao mesmo tempo a função de gestor e a de executor.

-
- 10** Organograma e carga operacional dos sócios
 - 11** Quadro de pessoal e folha mensal
 - 12** Estrutura de demandas — o que existe, entra e falta
 - 13** Fluxo de trabalho — posição e impacto


Onde tudo converge

A estrutura de pessoal e a carga que recai sobre cada sócio — sem camada de gestão intermediária entre a direção e a execução.



A CARGA DE CADA SÓCIO

ambos executam e gerenciam ao mesmo tempo



LEITURA DA ESTRUTURA

Toda a operação converge para dois pontos. **Quatro pessoas respondem aos dois sócios ao mesmo tempo** — Karla, Bruna, Deivson e Jennifer — e é aí que a coordenação entre eles vira pré-requisito, não preferência. Jonathan sustenta sozinho todo o comercial, administrativo, jurídico e contábil, e ainda absorve o pós-venda de forma permanente.

O próprio **Deivson acumula funções**: é Coordenador de Produção, mas atua na prática como Marceneiro Sênior — justamente porque a bancada está curta. As contratações abertas (marceneiro experiente, ajudantes e operador de CNC) existem para **liberar o Deivson para coordenar em vez de operar** e o Joelson para migrar às máquinas novas.

Nenhum dos dois sócios tem hoje uma camada de gestão intermediária plena entre si e a execução. Qualquer ausência de um deles trava o fluxo — é o risco estrutural que a página seguinte quantifica em folha e a página 13 destrincha por etapa.

FOLHA MENSAL · DADO DE REMUNERAÇÃO

Quadro de pessoal e custo

Cada pessoa da estrutura, com vínculo, fixo mensal e variável — e o que ainda falta contratar.

COLABORADOR	FUNÇÃO	VÍNCULO	FIXO MENSAL	VARIÁVEL / COMISSÃO
DIREÇÃO · SÓCIOS				
Jonathan	Diretor Comercial & Experiência	SÓCIO	10.000	pró-labore
Paulo	Diretor de Operações & Tecnologia	SÓCIO	10.000	pró-labore
ATIVOS HOJE				
Deivson	Coordenador de Produção	PJ	4.000	2,5% fabricação + 2,5% montagem + 1,0% coordenação
Samuel	Marceneiro Sênior	PJ	3.900	2,5% fabricação + 2,5% montagem
Jackson	Marceneiro Pleno	PJ	3.600	2,5% fabricação + 2,5% montagem
Filipe	Programador CNC	PJ	3.600	sem comissão
Joelson	Operador CNC & máquinas	CLT	2.500	2,5% montagem + R\$ 2,00/chapa cortada · VR + VT
Jomar	Marceneiro	CLT	1.950	sem comissão · VR 350 + VT 400
Davi	Ajudante	CLT	1.950	sem comissão · VR 350 + VT 400
Jonathan Godoy	Ajudante Geral · novo	CLT	1.620	salário mínimo · sem comissão · VR 350 + VT 400
INÍCIO JÁ ALINHADO				
Cezar data a definir	Marceneiro	PJ	3.600 estimado	2,5% fabricação + 2,5% montagem
Bruna dia 01	Arquiteta · programação + projetos	PJ	4.000	50% dos projetos vendidos aos clientes que ela atende
Karla dia 10	Assistente Operacional	CLT	2.000	VR 500 + transporte conforme local · progride a 3.200
PARCERIA EXTERNA				
Jennifer	Social media	EXT.	1.400	contrato à parte · fora da folha
Custo mensal a partir do próximo mês · direção + ativos + Bruna, Karla e Cezar + Jennifer			58.020	
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO — FORA DO NÚMERO ACIMA				
Paulo "Baiano"	Marceneiro experiente	PJ	3.900	mesmo escopo do Samuel · 2,5% + 2,5%
2 a 3 ajudantes	Apoio à produção · maior lacuna	CLT	1.950 cada	sem comissão · VR 350 + VT 400 cada
1 operador CNC	Assume a máquina atual	CLT	2.500	sem comissão · VR 350 + VT 400
Subtotal a contratar			12.550 a 15.250	Baiano + 2-3 ajudantes + operador CNC

PROGRESSÃO VALIDADA DA KARLA

1° ao 3° mês R\$ 2.000 · 3° ao 6° R\$ 2.500 · 6 meses a 1 ano R\$ 2.800 · a partir de 1 ano R\$ 3.200. Cada degrau só avança por entrega validada, não por tempo de casa.

REGRA DE COMISSÃO

Por **profissional e por etapa**, não por dupla: 2,5% por fabricação e 2,5% por montagem, pagas conforme a etapa executada; o coordenador acrescenta 1,0%. **Só existem quando há venda** — são custo variável, não folha fixa. Base: faturamento bruto.

ESTRUTURA DE DEMANDAS · PESSOAS E INFRAESTRUTURA

O que existe, o que entra e o que falta

Toda a demanda abaixo existe para dar vazão à capacidade que as máquinas novas vão exigir — sem ela, o investimento em máquina não converte em entrega.

CONTEXTO · ≈ 3 MESES

Novo galpão

Com **coladeira** e **centro de furação** novos. A equipe precisa estar formada e treinada **antes** da mudança — máquina parada por falta de gente é o pior dos cenários.

COMO A ESTRUTURA ESTÁ DIVIDIDA

ATIVO HOJE · 8 PESSOAS

Chão de fábrica, tecnologia e 2 duplas completas

- **Montagem:** Samuel/Jomar e Jackson/Davi — duas duplas completas e fluindo
- **Chão de fábrica:** Deivson, o único no nível de marceneiro sênior
- **Tecnologia:** Joelson (operação) e Filipe (programação)

INÍCIO JÁ ALINHADO · 3 PESSOAS

Datas fechadas

- **Bruna · dia 01** — programação e suporte de projetos, alivia o Filipe e o comercial
- **Karla · dia 10** — assume administrativo, jurídico e contábil, libera o Jonathan para vender
- **Cezar** — fecha a dupla 3, que hoje está incompleta (Godoy já atua)

A CONTRATAR · 4 A 5 PESSOAS

O que ainda falta

- **1 marceneiro experiente** — alvo Paulo "Baiano", em negociação; não sendo ele, perfil equivalente
- **2 a 3 ajudantes** — a maior lacuna da operação
- **1 operador CNC** — assume a máquina atual e libera o Joelson

SEQUÊNCIA DE ENTRADA

o que destrava o quê

QUANDO	O QUE ENTRA	O QUE ISSO DESTRAVA
Dia 01	Bruna entra	Programação e suporte de projetos aliviam o Filipe — que hoje é ponto único — e o comercial
Dia 10	Karla entra	Assume administrativo, jurídico e contábil e libera o Jonathan para vender
Curto prazo	4 a 5 contratações + ferramental	Marceneiro experiente, 2–3 ajudantes, operador CNC, 2 carros e 3 kits de ferramenta
≈ 3 meses	Novo galpão	Coladeira e centro de furação — exigem a equipe já formada e treinada

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

custo único


ITEM	PARA QUEM	VALOR
Cadeira + computador	Bruna	4.000 cadeira a definir
Kit de ferramentas	Paulo "Baiano"	3.000
Kit equipe de obra	Duplas de montagem	6.000 varia com o nível definido
Kit básico	Davi e Jonathan Godoy · R\$ 1.000 cada	2.000
Cadeira + celular	Karla	a definir
2 carros	Duplas 2 e 3 — hoje sem veículo	a definir
Subtotal mapeado · carros e mobiliário em aberto		15.000

O QUE JÁ LIMITA O RITMO ATUAL

2 das 3 duplas **não têm veículo** e todas operam com ferramental parcial. Isso restringe a produção de hoje, antes mesmo de qualquer máquina nova entrar. O Joelson precisa de **treinamento urgente** no maquinário novo, e só pode ser liberado quando houver um operador formado para assumir a CNC atual.

Fluxo de trabalho — posição e impacto

As seis etapas do primeiro contato ao pós-venda: quem atua, o que passa adiante e o que cada etapa define no resultado.

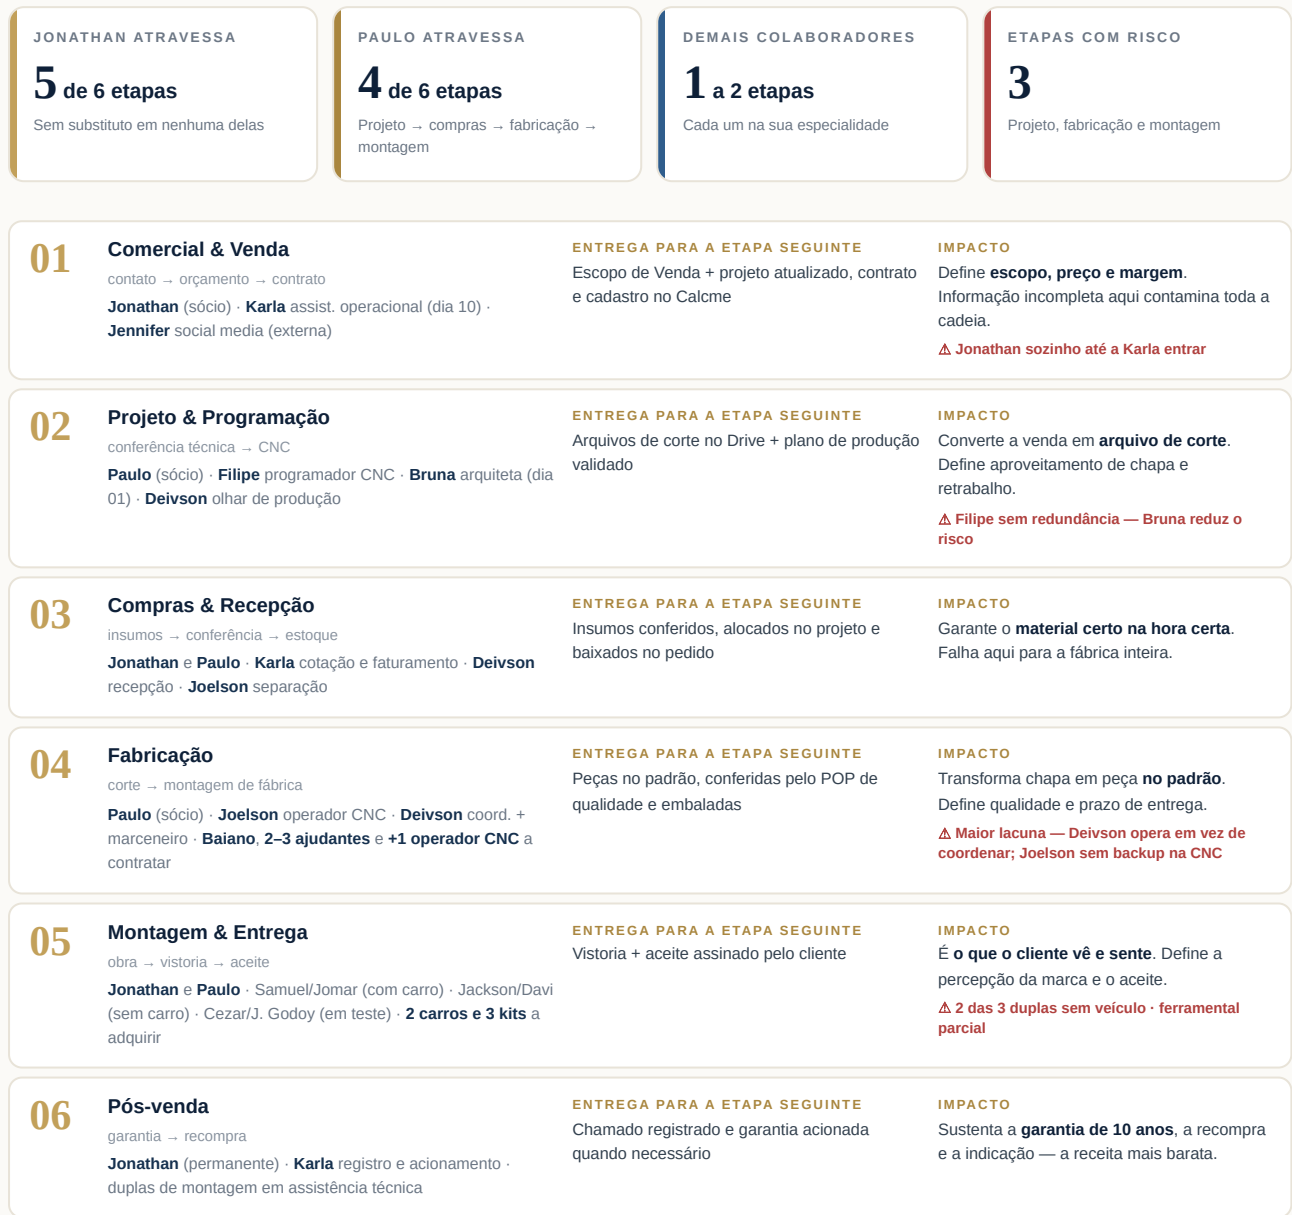

LEITURA DO FLUXO

O fluxo mostra por que a estrutura é frágil hoje: **os dois sócios atravessam quase toda a cadeia** enquanto cada colaborador ocupa apenas uma ou duas etapas. Nenhuma etapa avança sem passar por um deles, e qualquer ausência trava o fluxo inteiro. As entradas já alinhadas atacam justamente as pontas — Karla nas etapas 1, 3 e 6; Bruna criando a segunda pessoa em projeto. O centro da cadeia, **a fabricação, segue sendo a maior lacuna**.

PARTE TRÊS

Economia da Operação



Por que uma estrutura majoritariamente fixa transforma cada real adicional de faturamento em resultado desproporcional — e quanto custa, hoje, manter essa estrutura de pé. A margem já é conhecida e boa; o que limita o resultado é a quantidade de projetos.

15 Modelo econômico e alavancagem operacional

16 Custo da estrutura e investimento

Alavancagem operacional

A estrutura é majoritariamente fixa. Depois de cobrir o custo fixo, cada real adicional converte cerca de 34 centavos direto em resultado.

As mesmas máquinas, o mesmo galpão e a mesma equipe-base atendem um volume bem maior que o atual. É a definição de **alavancagem operacional** — e a Valvic está sentada sobre **capacidade ociosa**. A capacidade custa o mesmo cheia ou vazia, porque o custo fixo já está pago.

O QUE CADA NÍVEL DE VOLUME GERA

MC líquida de 34% · estrutura atual

FATURAMENTO / MÊS	MARGEM GERADA	RESULTADO / MÊS	RESULTADO / ANO
~R\$ 163k posição de referência · capacidade ociosa	R\$ 55k	limiar	—
R\$ 246k ponto de equilíbrio	R\$ 84k	R\$ 0	break-even
R\$ 300k	R\$ 102k	+R\$ 18,5k	+R\$ 222k
R\$ 400k meta Fase 1 — dobrar	R\$ 136k	+R\$ 52,5k	+R\$ 630k
R\$ 600k	R\$ 204k	+R\$ 120k	+R\$ 1,4 mi
R\$ 1.000k — visão (Fase 2)	R\$ 340k	+R\$ 256k	+R\$ 3,1 mi

Até cerca de **R\$ 400k/mês a estrutura atual absorve o volume** com custo fixo praticamente constante. De R\$ 400k a R\$ 1 mi, a Fase 2 — novas máquinas e galpão — adiciona capacidade. É exatamente onde o capital de um sócio investidor é aplicado.

O ENCAIXE · O QUE CADA LADO TRAZ

A VALVIC JÁ TEM	O SÓCIO APORTA
Capacidade instalada e paga	Capital para a Fase 2 — novas máquinas e galpão — que eleva o teto de R\$ 400k para R\$ 1 mi/mês
Operação que sabe entregar	Pipeline e demanda — o insumo que falta para encher a capacidade ociosa
Margem saudável e conhecida	Capital de giro para subsidiar orçamentos e acelerar o ciclo comercial

O QUE ISTO É

Uma **aposta em volume e escala** — o terreno onde capital e pipeline rendem mais. E a entrada numa empresa que **já cresce, já produz e já tem marca**, para acelerar o que funciona.

O caminho: manter o **bespoke premium** (marca e margem) e abrir uma **linha modular** para incorporação e construtora, que absorve volume — duas pistas, sem trair a identidade.

DIVERGÊNCIA DE PREMISSA · SINALIZADA, NÃO RESOLVIDA

Este modelo usa **margem de contribuição de 43,5%** (34% líquida). O Plano de Expansão da Parte V trabalha com **MC de ~30%** — premissa mais conservadora, adotada para o cálculo de payback.

As duas referências convivem neste caderno porque vêm de estudos distintos. **Qualquer decisão de aporte deve fixar uma única premissa**, validada com o contador.

O que custa manter a operação

A folha, os benefícios e o investimento único mapeado — separando o que já é custo do que ainda é decisão.

CUSTO MENSAL HOJE

R\$ 47,5 mil

2 sócios + 8 ativos + Jennifer · com benefícios CLT

A PARTIR DO PRÓXIMO MÊS

R\$ 58,0 mil

Entram Bruna, Karla e Cezar — acréscimo de R\$ 10,5k

AINDA A CONTRATAR

R\$ 12,6–15,3 mil

Baiano + 2–3 ajudantes + operador CNC · fora do número acima

INVESTIMENTO ÚNICO

R\$ 15 mil +

Ferramental mapeado · carros e cadeiras a definir

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL

BLOCO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Direção · pró-labore dos 2 sócios	20.000	R\$ 10.000 cada · ambos executam e gerenciam
Ativos hoje · 8 pessoas	26.120	Salários R\$ 23.120 + benefícios CLT R\$ 3.000
Entradas alinhadas · Bruna, Karla e Cezar	10.500	Valor do Cezar é estimativa até a formalização
Parceria externa · Jennifer	1.400	Contrato à parte, fora da folha
Custo mensal a partir do próximo mês	58.020	
Necessidades de contratação — ainda fora do cálculo	12.550 a 15.250	Elevaria o custo para R\$ 70,6 a 73,3 mil

NATUREZA DO VÍNCULO

a estrutura é mista por desenho

PJ · PRODUÇÃO E TECNOLOGIA

Deivson, Samuel, Jackson, Filipe, Bruna

Os papéis de **maior autonomia técnica** e remuneração variável relevante.
Comissionados por etapa executada.

CLT · FORMAÇÃO E APOIO

Joelson, Jomar, Davi, J. Godoy, Karla

As funções de **formação e apoio**, com benefícios fixos: VR R\$ 350 + transporte ~R\$ 400 = **R\$ 750/mês por colaborador**, somados sobre a folha.

VARIÁVEL · SÓ EXISTE COM VENDA

Comissões e participação

2,5% fabricação + 2,5% montagem por profissional, 1,0% de coordenação para o Deivson e R\$ 2,00/chapa para o Joelson. A Bruna tem **50% dos projetos que vender**. Nada disso é folha fixa.

O QUE ESTÁ EM ABERTO

Ficam a precificar: **2 carros** para as duplas 2 e 3, **cadeiras** para Karla e Bruna, o **celular da Karla** e o kit dos ajudantes a contratar (R\$ 1.000 cada). O kit da equipe de obra pode variar conforme o **nível de ferramenta** que for definido. O valor do Cezar segue como estimativa de referência até a formalização.

PARTE QUATRO

Passivo Trabalhista

IV

O levantamento das verbas rescisórias e dos encargos incidentes sobre os desligamentos já ocorridos no quadro de produção, apurado contrato a contrato. Um número fechado, com o perímetro do cálculo declarado — o que entra, o que não entra e por quê.

18 Apuração por contrato, encargos e perímetro

LEVANTAMENTO · POSIÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO

Apuração por contrato

Verbas rescisórias e encargos incidentes sobre os seis desligamentos do quadro de produção, com data de conclusão definida.

CONTRATOS ENCERRADOS

6

Equipe de produção · marceneiros

VERBAS RESCISÓRIAS

R\$ 27.268,84

13º, férias + 1/3 e FGTS

ENCARGOS PATRONAIS

R\$ 1.422,45

Incidentes sobre o 13º

PASSIVO TOTAL

R\$ 28.691,29

Sem saldo de dias · sem multa de 40%

APURAÇÃO CONTRATO A CONTRATO

valores em reais · base salário contratual

COLABORADOR	PERÍODO DO CONTRATO	SALÁRIO	13º PROP.	FÉRIAS + 1/3	FGTS 8%	SUBTOTAL
Jomar Marceneiro · 47 meses	24/06/2022 a 30/04/2026	1.950,00	650,00	2.166,67	7.332,00	10.148,67
Samuel Marceneiro · 9 meses	01/08/2025 a 30/04/2026	2.500,00	833,33	2.500,00	1.800,00	5.133,33
Deivison Marceneiro · 9 meses	01/09/2025 a 31/05/2026	2.500,00	1.041,67	2.500,00	1.800,00	5.341,67
Joelson Marceneiro · 15 meses	01/02/2025 a 30/04/2026	1.950,00	650,00	650,00	2.340,00	3.640,00
Davi Marceneiro · 3 meses	01/02/2026 a 30/04/2026	1.950,00	487,50	650,00	468,00	1.605,50
Filipe Marceneiro · 3 meses	01/03/2026 a 31/05/2026	1.700,00	425,00	566,67	408,00	1.399,67
Total das verbas rescisórias			4.087,50	9.033,34	14.148,00	27.268,84
Encargos patronais sobre o 13º						1.422,45
INSS patronal + terceiros / RAT 26,8% · FGTS 8%						

PASSIVO TRABALHISTA APURADO

R\$ 28.691,29

O valor está concentrado no tempo de casa, não no número de pessoas: o FGTS responde por 49% do total, e o contrato mais antigo sozinho por R\$ 10.148,67.

CRITÉRIOS DA APURAÇÃO

COMO CADA VERBA FOI CALCULADA

- Base.** Salário contratual mensal, sem médias de variáveis ou adicionais.
- Conclusão.** 30/04/2026, exceto Deivison e Filipe em 31/05/2026. Todos por demissão sem justa causa.
- FGTS.** 8% da remuneração de cada mês, sobre a duração integral do vínculo.
- Férias.** Proporcionais do período aquisitivo em curso, acrescidas do terço constitucional.
- Encargos.** Incidem apenas sobre o 13º, por ser verba salarial. Confirmado enquadramento no Simples sem CPP, o passivo recua para R\$ 27.595,84.

NÃO COMPUTADO NESTA APURAÇÃO

- Multa de 40% do FGTS** — incidiria sobre o saldo da conta vinculada de cada colaborador.
- Aviso prévio** — devido em desligamento sem justa causa, indenizado ou trabalhado, crescendo 3 dias por ano de casa.
- Férias vencidas** — considerados regularmente gozados os períodos aquisitivos já completados.

Os itens acima são conhecidos e mapeados. Ficaram fora para que o número apresente exatamente o perímetro definido.

Caminhos de Expansão



De R\$ 250 mil a R\$ 1 milhão por mês, em degraus. Cada degrau com o seu gatilho de demanda, o gargalo que ataca e o investimento que exige. As máquinas com ficha técnica e preço; o galpão com os dois caminhos possíveis. **Não há recomendação aqui** — há caminhos, custos e trade-offs postos lado a lado, para que a decisão seja informada e consciente.

-
- 20 A escada de produção
 - 21 Galpão: adaptar o atual ou mudar
 - 22 Comparativo de coladeiras
 - 23 Linha industrial e complementares
 - 24 Diferencial de mercado — puxadores
 - 25 Prestação de serviços
 - 26 Plano de expansão 2026–2027
 - 27 Retorno e payback

A ESCADA DE PRODUÇÃO

Do teto atual ao horizonte de R\$ 1 milhão

Cada degrau responde à demanda que passou a puxar acima do patamar anterior e ao gargalo que limita a produção naquele ponto.



QUADRO-RESUMO DA ESCADA

valores-âncora

DEGRAU	O QUE ENTRA	INVESTIMENTO-ÂNCORA	GATILHO
R\$ 250 mil hoje	Estrutura atual	—	ponto de partida
R\$ 300 mil degrau 1	+1 marceneiro, +2 ajudantes, +1 carro	Folha ~R\$ 9k/mês + veículo	demanda > teto
R\$ 400 mil degrau 2	Upgrade de coladeira + habilitação (única)	R\$ 160–480k + R\$ 56–61k	demanda > 300
R\$ 600 mil degrau 3	Reorganização do galpão (única) + 2 duplas	Reorg. ~R\$ 50–79k + folha ~R\$ 14k/mês	demanda > 400
R\$ 1 milhão horizonte	Galpão novo + linha interligada	Galpão + nesting + furação + coladeira	demanda > 600

POR QUE UMA ESCADA, E NÃO UM SALTO

Cada degrau ataca o gargalo daquele momento e destrava a capacidade seguinte. Assim, o **capital entra na medida em que a demanda real o justifica**, e o risco fica distribuído no tempo em vez de concentrado numa aposta única.

A escada não é um cronograma rígido — é um **mapa de decisão**. O ritmo real é ditado pela demanda, não pelo documento.

O FIO CONDUTOR FINANCEIRO

A régua que atravessa todos os degraus é a **margem de contribuição de ~40%**. Cada passo só se justifica se o faturamento adicional **preservar essa margem** — cobrindo o custo fixo que ele mesmo cria e ainda ampliando o resultado.

Os números são **âncoras**: ordem de grandeza para orientar a decisão, não um orçamento fechado. Valores de máquina são de feira.

INFRAESTRUTURA

Galpão: adaptar o atual ou mudar

Os dois caminhos para a mesma meta, com os custos abertos. A diferença entre eles é sobretudo de capital e de risco.

CAMINHO A

Escada dentro do galpão atual

Cheque menor por etapa, capital diluído no tempo, na medida da demanda. Em contrapartida, **parte da obra civil não migra** — vira custo afundado ao mudar de galpão — e o teto físico do atual fica em ~R\$ 600 mil/mês.

CAMINHO B

Salto direto para o galpão novo

Sem retrabalho. Nenhuma obra afundada, a estrutura já nasce para o milhão e chega ao topo mais rápido. Em contrapartida, o **cheque de largada é grande e concentrado**, e exige demanda já engatilhada para não ociosar a capacidade instalada.

CAMINHO A · CUSTOS ABERTOS DA ADAPTAÇÃO

investimento único · não migra

ITEM	NATUREZA	REFERÊNCIA
HABILITAÇÃO DA COLADEIRA · DEGRAU 2		
Compressor maior ar comprimido para a máquina	Equipamento	R\$ 25.000
Exaustor 5 cv exaustão de pó e vapores	Equipamento	R\$ 6.000
Rede elétrica + transformador	Instalação	~R\$ 10.000
Frete + instalação	Logística	~R\$ 20.000
REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO · DEGRAU 3		
Mezanino no fundo área adicional de apoio e estoque	Obra civil	~R\$ 25.000
Elétrica / iluminação / ventilação	Instalação	R\$ 12–15.000
Carrinhos / esteira interna circulação de peças	Equipamento	~R\$ 8.000
Rede pneumática	Instalação	~R\$ 5.000
Piso usinado opcional	Obra civil	~R\$ 12.000
Patamar + rampa ou descer a esquadrejadeira — alternativa	Obra civil	a definir
Faixa total da adaptação · habilitação + reorganização		R\$ 90–120 mil

CAMINHO B · COMPOSIÇÃO DO SALTO

CAMINHO A · OBRA NO ATUAL

R\$ 90–120k

Diluído entre os degraus 2 e 3 · **não migra**

CAMINHO B · CHEQUE DE LARGADA

R\$ 1,5–2 mi

Galpão + linha de máquinas · concentrado

TETO DO GALPÃO ATUAL

~R\$ 600k

O milhão exige a mudança de qualquer forma

► PONTO DE CONTEXTO — FATO, NÃO RECOMENDAÇÃO

As **máquinas Giben migram e têm revenda/troca** — acompanham a empresa para o galpão novo. Já a **obra civil é específica de cada galpão** e não se muda. Onde o capital é alocado — em ativo que migra ou em estrutura fixa — pesa de forma diferente em cada caminho.

COMPARATIVO DE MÁQUINAS

As coladeiras, lado a lado

A coladeira de bordas é a máquina que destrava a produção. A atual atende até ~R\$ 300 mil e não finaliza 100% — por isso o upgrade no degrau 2.

CRITÉRIO	RAIZEN SPECTRA 7GT	USIKRAFT PEGASUS 1100	GIBEN KG668	GIBEN KG712	GIBEN KG398J PUXADORES ★
Valor de feira	R\$ 160 mil	R\$ 200 mil	R\$ 260 mil	R\$ 410 mil	R\$ 480 mil
Posição	Menor cheque de entrada	Meio-termo de acabamento	Referência do mercado moveleiro	Topo — automação plena	Puxador integrado · lançamento
Recursos	7 grupos de trabalho	12 grupos · fita até 3 mm · 6 rolos pneum.	Regulagens finas manuais · manutenção simples	Regulagens automáticas · magazine de 4 fitas	Usina puxador / perfil integrado na peça
Filetagem (peça reta)	a confirmar	a confirmar	22 m/min	a confirmar (alta)	8 m/min (baixa)
Bipagem / telemetria	Não	Não	Não	Sim	a confirmar
Pega a usada na troca	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Assistência / revenda	Fraca	Média	Forte · BH	Forte	Forte · Giben
Logística + instalação	~R\$ 20 mil	~R\$ 20 mil	~R\$ 20 mil	~R\$ 20 mil	~R\$ 20 mil
Atende até R\$ 600k sem troca	Provável que não	Meio-termo	Sim	Sim	Diferencial · não é a de volume
Entra no degrau	2 · 400 mil	2 · 400 mil	2–3 · 400–600	3 · 600 mil	qualquer fase

O QUE PESA EM CADA ESCOLHA

RAIZEN SPECTRA 7GT · R\$ 160K O menor cheque possível A favor: menor investimento de entrada; marca que a equipe já conhece e opera. A ponderar: depreciação alta e revenda fraca; não pega usada na troca — vira custo afundado ao migrar — e provavelmente não basta até os 600 mil.	USIKRAFT PEGASUS 1100 · R\$ 200K O meio-termo de acabamento A favor: 12 grupos operacionais, bordas mais limpas e fita PVC/ABS até 3 mm, que cobre a linha premium. Bom custo-benefício. A ponderar: sem bipagem ou telemetria; não pega usada na troca; assistência a confirmar na região.	GIBEN KG668 · R\$ 260K O capital que se preserva A favor: marca moveleira conceituada que preserva valor; pega a usada na troca, migra para o galpão novo e tem showroom, técnico e treinamento em BH. Atende até 600 sem nova troca. A ponderar: regulagens ainda manuais; sem bipagem.
--	--	--

NOTA SOBRE CUSTOS QUE NÃO APARECEM NO PREÇO

Além do valor da máquina, cada coladeira exige **frete e instalação (~R\$ 20 mil)** e a **habilitação no galpão** — compressor, exaustão e elétrica — um investimento único de **~R\$ 56–61 mil no total**. A diferença real entre as opções não está só no preço de etiqueta: está em **revenda, assistência local e migração** para o galpão novo.

FICHAS TÉCNICAS · LINHA INDUSTRIAL

Corte, furação e apoio

As máquinas do horizonte de R\$ 1 milhão — nesting e centro de usinagem — e os equipamentos que sustentam o fluxo.

VALOR DE FEIRA · R\$ 530 MIL

Nesting Giben

Centro de corte nesting com bipagem · base da linha

Função	Corte nesting
Rastreabilidade	Bipagem de peça
Aproveitamento	Plano otimizado
Integração	Coladeira + furação

Substitui o corte tradicional por um fluxo **automatizado e rastreável**, com menos desperdício de chapa. É a **porta de entrada da linha interligada**.

A ponderar: cheque elevado, só no salto industrial — pede galpão maior e demanda engatilhada.

VALOR DE FEIRA · R\$ 360 MIL

Giben Flexdrill

Centro de usinagem / furação CNC com bipagem

Função	Furação CNC
Rastreabilidade	Bipagem de peça
Precisão	Programada, repetível
Integração	Fecha corte–colagem–furação

Fecha o **trio da linha**: a peça sai cortada, colada e **furada**, pronta para montar. Menos retrabalho e montagem mais rápida — o que sustenta o volume do milhão.

A ponderar: ganho pleno só com nesting e coladeira juntos.

COMPLEMENTARES

apoio de fluxo e expedição

EQUIPAMENTO	PAPEL	ENTRA QUANDO	REFERÊNCIA
Esteira de retorno	Devolve a peça ao operador após a colagem sem carregar manualmente. Reduz o deslocamento interno, acelera o ciclo da coladeira e sustenta o ritmo quando a produção sobe.	Reorganização · degrau 3+	R\$ 60.000
Embaladora	Protege e padroniza a peça na expedição — acabamento profissional na entrega e menos avaria no transporte. Ganha relevância com volume alto e operação de linha.	Linha industrial	a partir de R\$ 60.000

LINHA COMPLETA · HORIZONTE

R\$ 890 mil

Nesting (R\$ 530k) + Flexdrill (R\$ 360k), **antes** da coladeira, dos complementares e do galpão. É o núcleo do cheque de R\$ 1,5–2 milhões do Caminho B.

POR QUE SÓ FAZ SENTIDO EM CONJUNTO

Cada máquina isolada entrega menos do que promete. O ganho real da linha industrial vem da **integração**: corte nesting, colagem e furação falando a mesma língua, com bipagem entre as etapas. Deixa de ser "uma máquina a mais" e passa a ser um **sistema de produção** — e é isso que o patamar de R\$ 1 milhão exige.

DIFERENCIAL DE MERCADO

A máquina de puxadores

Por que um único equipamento pode reposicionar o produto Valvic — ampliando margem por percepção de valor, não por volume.

Entre todas as máquinas deste caderno, a coladeira de puxadores é **a única cujo retorno não vem de produzir mais, e sim de produzir diferente**. Ela usina o puxador — o perfil de pega — **integrado à própria peça**, eliminando a ferragem comprada de terceiros. O resultado é um móvel de linhas limpas, sem puxador aparente, com um acabamento que o cliente percebe imediatamente como superior.

GIBEN KG398J · VALOR DE FEIRA R\$ 480 MIL

Modelo de lançamento, inédito em Minas Gerais

Função	Puxador / perfil integrado na peça
Filetagem	8 m/min — baixa · diferencial, não volume
Exclusividade	Nenhuma marcenaria de MG a tem ainda
Pega usada na troca	Sim · Giben

O QUE ELA CRIA

Um produto que o concorrente não tem

- **Ineditismo em MG** — possivelmente alguém no Sul de Minas venha a ter, segundo vendedores do ramo
- Puxador integrado como **assinatura visual** difícil de copiar
- Elimina o **custo e o prazo** da ferragem de puxador comprada
- Eleva a **percepção de valor** e o preço praticável

— POR QUE IMPORTA PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO

As demais máquinas ampliam **capacidade**; esta amplia **a marca**. Num mercado de móveis planejados onde a concorrência disputa preço, um diferencial de **design proprietário** muda o eixo da conversa com o cliente — de "quanto custa" para "**isto só a Valvic faz**".

Há sinal de mercado: em São Paulo, um proprietário dessa máquina está **amplamente abastecido de demanda** de arquitetas e marcenarias do entorno. É um módulo que **se paga em posicionamento** — cada projeto premium carrega margem maior.

A PONDERAR COM CLAREZA

Ela **fileta a ~8 m/min**, velocidade baixa — **não é a coladeira de volume** em peças retas. O ideal em produtividade é ter uma coladeira rápida para retas (ex.: Giben KG668) e a KG398J como diferencial competitivo. Uma não substitui a outra.

LEITURA ESTRATÉGICA

Não compete com as coladeiras de produção — **complementa**. Enquanto a linha resolve o **volume**, os puxadores resolvem o **valor**.

Em uma frase: transforma o móvel Valvic em **produto de assinatura** — e a marca em algo que se escolhe por desejo, não só por orçamento.

CENÁRIO ADICIONAL

Prestação de serviços

Como a linha industrial vira um segundo motor de receita — e por que isso reduz o risco de todo o investimento.

Uma linha dimensionada para R\$ 1 milhão de produção própria dificilmente estará **100% ocupada o tempo todo**. Essa folga — que num modelo tradicional seria custo ocioso — pode virar **receita**. Com nesting, coladeira e furação equipados com bipagem, a Valvic passa a poder **vender capacidade de produção** a terceiros: corte, colagem e furação para marcenarias sem CNC próprio.

O MODELO**Capacidade ociosa vira receita**

A mesma linha que produz o móvel Valvic presta **serviço B2B** nas janelas livres. O cliente é a marcenaria menor, sem máquina, que precisa de corte e colagem de qualidade industrial. A Valvic vende **a própria capacidade**, não só o produto final.

O EFEITO NO CAIXA**Preenche os vales de demanda**

Nos meses de produção própria mais fraca, o serviço **preenche o buraco de caixa**. A operação deixa de depender exclusivamente do ciclo de vendas de móveis planejados e ganha uma **receita mais estável** ao longo do ano.

A PRECIFICAÇÃO**Margem alta e auditável**

A **telemetria** da coladeira mede o metro colado real; a bipagem conta as peças. Isso permite **precificar por peça ou por metro** — cobrança justa, transparente e medida pela própria máquina, sem estimativa grosseira.

O PONTO CENTRAL**De-risca o investimento**

A prestação de serviços **transforma o CAPEX em ativo que fatura mesmo com a produção própria não cheia**. A linha industrial passa a se pagar por **dois caminhos, não um só** — e é isso que reduz o risco de todo o investimento em máquinas.

CONSEQUÊNCIA PRÁTICA — MUDA A ESTRATÉGIA DE LOCALIZAÇÃO

Se o serviço mirar atender a demanda de **BH, Contagem e entornos**, a **localização do galpão passa a ser fator estratégico**: estar perto dos clientes B2B — marcenarias e lojas — muda a escolha do endereço. Proximidade vira vantagem logística e comercial, e essa decisão precisa ser tomada **antes** de fechar o galpão novo, não depois.

SÍNTESE DO CENÁRIO

Não é um negócio paralelo que disputa foco — é o **aproveitamento inteligente** de uma capacidade que, de outro modo, ficaria parada. Receita de margem alta, que estabiliza o caixa e reduz o risco de todo o investimento em máquinas.

Fases, máquinas e mapa do investimento

A versão executiva do plano: o que entra na Fase 1 para girar já, e o que a Fase 2 exige para a estrutura completa.

FASE 1 · IMEDIATO

Start do negócio — girar com o essencial

- Nova **coladeira de borda** Giben KG268 — arredondador, fita 1 mm
- Novo **compressor** Techto 10 HP — alimenta a nova linha
- Camionete usada** — reforço de logística imediato
- +1 marceneiro, +1 auxiliar administrativo, +1 ajudante
- Setup de postos: 2 kits de ferramentas + móveis

≈ R\$ 251–263 mil

FASE 2 · ESTRUTURA COMPLETA

Galpão novo, todas as máquinas rodando

- Nova **CNC nesting** Giben — capacidade 2× a Solid TAF
- Furação horizontal** Raizen 3S — portas, cavilhas, fechaduras
- Galpão 1.000 m²** — 40 × 25 m com doca de caminhão
- Kia Bongo baú** — carga 1,5 t para o volume dobrado
- +1 marceneiro, +1 ajudante, +1 projetista

≈ R\$ 872 mil

MAPA DO INVESTIMENTO

consolidado das duas fases

ITEM	DETALHE	VALOR R\$
FASE 1 · START IMEDIATO		
Coladeira Giben KG268	Principal — arredondador + fita 1 mm · suporte local em BH	~162.000
Compressor Techto AT 10HP	10 HP / 7,5 kW · 8,5 bar · cabine acústica · instalação externa	21.310
Camionete usada	Reforço de logística	50–60.000
Setup de pessoal	CAPEX único · 2 kits + posto adm. + 7 cadeiras	~18–20.000
Total Fase 1		≈ 251–263.000
FASE 2 · ESTRUTURA COMPLETA		
CNC Nesting Giben G2 1929	~1.430 chapas/mês · etiquetagem + furação · carga de palete inteiro	490.000
Furação horizontal Raizen 3S	Topo e borda do MDF — cavilha, minifix, fechadura, dobradiça	82.000
Kia Bongo baú	Carga ~1,5 t · entrega do volume dobrado	~100.000
Infraestrutura do galpão	Reforma · elétrica 150 kVA · aspiração · ar comprimido	~200.000
Total Fase 2		≈ 872.000
Investimento total · Fase 1 + Fase 2		≈ R\$ 1.100.000

POR QUE PAGAMENTO À VISTA

O aporte **compra as máquinas à vista**, desbloqueando **desconto de 10–15%** que financia parte do próprio processo — e elimina parcelas mensais que pressionariam o caixa durante a rampa de produção.

AINDA EM ABERTO

- Custo mensal do galpão** (aluguel) — impacta o ponto de equilíbrio final.
- Capital de giro** operacional durante a rampa — não incluído no total.
- Estrutura do aporte** — valor e contrapartida (% societária ou empréstimo remunerado) não fixados.
- Confirmar se os preços Giben são **à vista** e solicitar desconto.

RETORNO AO INVESTIDOR

Cenários e payback

Dois cenários sobre o mesmo investimento de R\$ 1,1 milhão — o conservador, de dobrar a produção, e o de capacidade instalada.

CENÁRIO 1 · CONSERVADOR

Dobrar: R\$ 200k → R\$ 400k / mês

Receita nova	+R\$ 200k /mês adicional
MC 30%	+R\$ 60k MC adicional/mês
Folha nova	-R\$ 41k com encargos/mês
Sobra líquida	≈ R\$ 19k /mês

~55 meses · ~4,6 anos

Antes de fixos novos — aluguel, energia e combustível — ainda a incluir. Eles reduzem o saldo e alongam o payback.

CENÁRIO 2 · CAPACIDADE INSTALADA

R\$ 1 milhão / mês — teto das máquinas novas

Receita nova	+R\$ 800k /mês adicional
MC 30%	+R\$ 240k MC adicional/mês
Investimento	R\$ 1,1 mi total da estrutura
Payback no pico	< 5 meses

< 12 meses · por alavancagem operacional

O cenário exige demanda engatilhada para não ociosar a capacidade — é onde o pipeline do investidor pesa mais que o capital.

A ALAVANCAGEM OPERACIONAL, EM UMA FRASE

O PRINCÍPIO

Custo fixo linear, capacidade exponencial

Com a estrutura instalada, o custo fixo cresce **de forma linear** enquanto a capacidade de faturamento cresce **de forma exponencial**. A mesma folha, o mesmo galpão e as mesmas máquinas que produzem R\$ 400 mil/mês são as que chegam a **R\$ 1 milhão/mês** — o diferencial vira **capital de giro e carteira comercial**.

AS DECISÕES QUE FICAM NA MESA

DECISÃO	O QUE ESTÁ EM JOGO	EXTREMOS
Ritmo	Crescer por etapas, na medida da demanda — o R\$ 1 milhão como horizonte, não como prazo.	Gradual (menor risco) ↔ acelerado (chega antes)
Galpão	Onde a expansão acontece e como o capital fica exposto.	Atual (obra R\$ 90–120k) ↔ novo (cheque R\$ 1,5–2 mi)
Coladeira	Cheque menor agora × capital que preserva valor e migra.	Raizen R\$ 160k ↔ Giben KG668 R\$ 260k
Alavancas	Diferenciação de produto e monetização da capacidade instalada.	Puxadores (margem) + serviços (de-risca)

O QUE VALIDAR ANTES DE SUBIR CADA DEGRAU

Confirmar **demanda sustentada** acima do patamar atual · identificar o **gargalo real** que o investimento vai atacar · checar que o salto **preserva a margem**. Para fechar números: obter **propostas finais** das máquinas (de feira → firmes), orçar a **infraestrutura** com fornecedores locais e definir a **forma de aporte** e o payback aceitável por etapa.

ENCERRAMENTO

Os caminhos estão *postos na mesa*

Este caderno apresenta **caminhos e realidades**, de forma organizada — não uma recomendação. Cada degrau tem o seu gatilho, cada máquina o seu momento, cada galpão o seu trade-off. O material existe para que a decisão seja **informada e consciente**, por quem tem os números na ponta da língua.

DOCUMENTOS DE ORIGEM · REUNIDOS NESTE VOLUME

07 ago 2026	Passivo Trabalhista — Posição Apurada	Parte IV
25 jul 2026	Estrutura de Demandas — Pessoas & Infraestrutura	Parte II
25 jul 2026	Fluxo de Trabalho — Posição & Impacto	Parte II
20 jul 2026	Organograma & Carga Operacional	Parte II
16 jul 2026	Panorama Comercial — Rumo a Agosto	Parte I
06 jul 2026	Caminhos de Expansão — Apresentação Visual	Parte V
06 jul 2026	Dossiê Técnico de Expansão	Parte V
29 jun 2026	Modelo Econômico & Alavancagem Operacional	Parte III
26 jun 2026	Plano de Expansão 2026–2027	Parte V

Uso restrito. Contém dado de remuneração e posição financeira — não circular fora dos sócios e do destinatário.

Valvic Marcenaria · Vargis Decor Ltda · CNPJ 17.269.304/0001-51 · Belo Horizonte / MG

AGOSTO
2026
