



LEVANTAMENTO SOLICITADO · AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

Fluxo Financeiro

Todo o movimento previsto para os dois próximos meses — o que entra, o que sai e o que sobra — em duas leituras: **caixa** (dinheiro que circula) e **competência** (resultado que o período gerou).

A RECEBER NOS 2 MESES

R\$ 378,4 mil

PRODUÇÃO A CONCLUIR R\$ 695,4 mil 16 contratos · valor bruto dos dois meses	JÁ RECEBIDO ANTES R\$ 317,0 mil Sinais e parcelas cobrados em meses anteriores	A RECEBER AGO + SET R\$ 378,4 mil R\$ 192,9k em agosto · R\$ 185,5k em setembro	FORA DESTES FLUXO R\$ 87,0 mil André / Alphaville — sem data de recebimento
---	--	---	---

AGOSTO · CONTRATOS A CONCLUIR

valores em reais

CLIENTE	VALOR DO CONTRATO	JÁ RECEBIDO	A RECEBER	% JÁ EM CAIXA
Cristiane	94.000	42.000	52.000	45%
Lucas Mello	46.000	24.000	22.000	52%
Rejane	35.600	14.000	21.600	39%
Augusto	90.000	63.000	27.000	70%
Carla	27.000	13.500	13.500	50%
Flavia	15.000	—	15.000	0%
Luciana Rajão	12.000	—	12.000	0%
Bernardo	13.000	4.000	9.000	31%
Tania	8.500	—	8.500	0%
Giseli	14.000	7.000	7.000	50%
Luiz	5.300	—	5.300	0%
Total de agosto · 11 contratos	360.400	167.500	192.900	46%

SETEMBRO · CONTRATOS A CONCLUIR

CLIENTE	VALOR DO CONTRATO	JÁ RECEBIDO	A RECEBER	% JÁ EM CAIXA
Ana Carolina	108.000	32.500	75.500	30%
Maria · Vale dos Cristais	124.000	58.000	66.000	47%
Andrea · clínica	47.000	14.000	33.000	30%
Richard	22.000	11.000	11.000	50%
Simony	34.000	34.000	—	100%
Total de setembro · 5 contratos	335.000	149.500	185.500	45%

CORREÇÃO APLICADA AO LEVANTAMENTO ORIGINAL

O rascunho da reunião somava **R\$ 443 mil a receber**. O valor correto é **R\$ 378,4 mil** — diferença de **R\$ 64,6 mil**. A causa: o cliente **Augusto** entrou na soma pelo saldo a receber (R\$ 27 mil) e não pelo contrato (R\$ 90 mil), enquanto os **R\$ 63 mil já recebidos dele** ficaram fora da linha de recebidos. **Leonardo (R\$ 55 mil)** foi retirado de setembro e não consta aqui.

Caixa e competência

O mesmo período conta **duas histórias diferentes**, e as duas são verdadeiras. Por **competência**, o resultado mede o que os dois meses produziram — receita de tudo o que for entregue, menos o custo de produzir. Por **caixa**, mede só o dinheiro que efetivamente circula na conta. A distância entre as duas é o retrato do capital de giro da empresa.

LEITURA POR COMPETÊNCIA

o que o período gera de resultado

LINHA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES
Receita reconhecida valor dos contratos concluídos no mês	360.400	335.000	695.400
(-) Custo variável material, ferragem, terceirizados, comissões e impostos · 56,5%	203.626	189.275	392.901
= Margem de contribuição 43,5% da receita	156.774	145.725	302.499
(-) Custo fixo da estrutura folha, pró-labore, galpão, administrativo, logística e marketing	76.186	81.920	158.106
= Resultado operacional do período	+80.588	+63.805	+144.393

LEITURA POR CAIXA

o dinheiro que entra e sai na conta

LINHA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES
Entradas — parcelas a receber	192.900	185.500	378.400
(-) Compra de material e terceirizados premissa: desembolso no mês da produção	203.626	189.275	392.901
(-) Custo fixo da estrutura	76.186	81.920	158.106
(-) Serviço de dívida máquinas R\$ 4.800 + conta garantia -R\$ 3.000 + consórcio R\$ 1.100	8.900	8.900	17.800
= Resultado de caixa do período	-95.812	-94.595	-190.407

A PONTE ENTRE AS DUAS

de onde vem a diferença de R\$ 334,8 mil

DA COMPETÊNCIA PARA O CAIXA	DOIS MESES
Resultado por competência	+144.393
(-) Receita já recebida em meses anteriores sinais e parcelas cobrados antes — o dinheiro entrou e já foi gasto	-317.000
(-) Amortização de dívida saída de caixa que não é despesa do período	-17.800
= Resultado de caixa	-190.407


O QUE ESTA PONTE MOSTRA

A operação dá lucro.
O caixa é que não fecha.

Os dois meses **geram R\$ 144 mil de resultado** — a margem cobre o custo fixo com folga. Mas **R\$ 317 mil da receita desses contratos já entrou e já foi consumido** em meses anteriores. A empresa produz agora com dinheiro que recebeu antes. **Isso é gargalo de capital de giro, não de rentabilidade.**

A PREMISSA MAIS FRÁGIL DESTE DOCUMENTO

O resultado de caixa depende inteiramente de **quando o material é comprado**. A empresa ainda **não mede o cronograma de desembolso** — hoje só se sabe o custo total do projeto, não em que mês ele sai da conta. Boa parte da chapa e da ferragem dos contratos de agosto foi comprada em junho e julho. Abaixo, o mesmo fluxo com as duas hipóteses extremas.

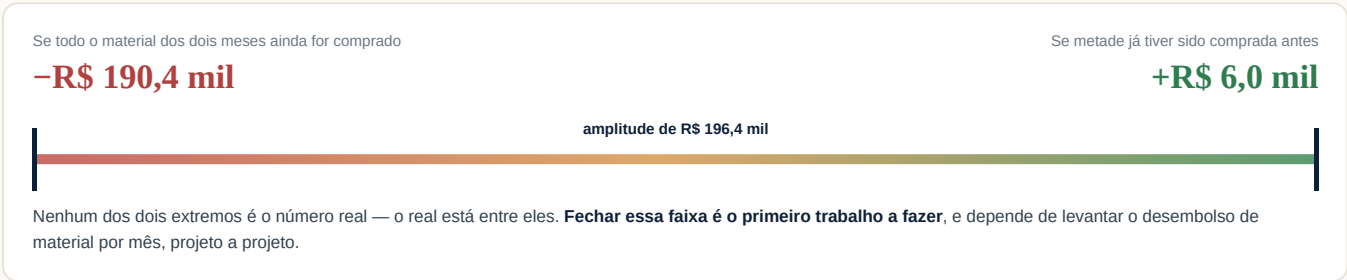

BASE DE CÁLCULO UTILIZADA

O QUE SUSTENTA CADA LINHA

- Receita.** Valor de contrato dos projetos com conclusão prevista em cada mês, conforme a posição comercial.
- Custo variável 56,5%.** Derivado da margem de contribuição média de 43,5% apurada em 2025. É uma média — **não** o custo real destes contratos.
- Custo fixo.** Folha e pró-labore atualizados (R\$ 57,2k em agosto e R\$ 62,9k em setembro, com a entrada da assistente e do programador) somados a galpão, administrativo, logística e marketing.
- Serviço de dívida.** Parcelas recorrentes com forma já definida.

O QUE AINDA NÃO ESTÁ MEDIDO

- Custo real por projeto.** Não há apuração de custo executado contra o orçamento. A MC de 43,5% pode estar acima ou abaixo do real em cada contrato.
- Cronograma de desembolso.** Quando cada compra sai da conta — a origem da faixa acima.
- Avanço físico.** Quanto de cada contrato foi executado. Sem isso, a competência é aproximada pela data de conclusão, e não pela medição.
- Rubricas de estrutura** fora da folha datam de junho e precisam ser reconferidas.

POSIÇÕES FORA DO FLUXO DOS DOIS MESES

POSIÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
André · Alphaville	87.000	Projeto entregue , cobrança integralmente em aberto e sem data . Registrado no histórico como recebível ligado a investimento dos sócios, não como inadimplência de cliente externo. Não entra em nenhum dos dois meses .
Aporte já consumido	71.000	Parcela do primeiro aporte usada para cobrir o déficit de caixa de julho . Não foi aplicada em máquina, estrutura ou expansão — foi capital de giro . É a evidência prática do gargalo descrito na página 2.
Passivo trabalhista	28.691	Verbas e encargos dos seis desligamentos já ocorridos, ainda não desembolsados e fora do fluxo acima. Perímetro e memória de cálculo em documento próprio.
Total fora do fluxo		R\$ 87,0k a receber sem data · R\$ 28,7k a pagar sem data

O QUE SERÁ CONSTRUÍDO A SEGUIR

PRIORIDADE 1 · ATÉ 30 DIAS

Cronograma de desembolso por projeto

Levantar, contrato a contrato, **quando cada compra de material sai da conta**. É o que fecha a faixa de R\$ 196 mil e transforma esta projeção em previsão.

PRIORIDADE 2 · ATÉ 60 DIAS

Custo real por projeto

Apurar o **executado contra o orçamento** em cada contrato entregue. Sem isso, a margem de 43,5% segue sendo média histórica, e não o resultado de cada obra.

PRIORIDADE 3 · ATÉ 90 DIAS

Resultado mensal por competência

Fechar **todo mês** receita reconhecida, custo variável, margem, custo fixo e resultado — no mesmo formato da página 2, com número apurado no lugar de premissa.

LEITURA DE CONJUNTO

Os dois meses fecham com **R\$ 695,4 mil de produção** e **R\$ 144 mil de resultado operacional** — o volume e a margem sustentam a estrutura. O aperto está no **descasamento entre receber e pagar**: quase metade da receita destes contratos foi cobrada e consumida antes de a produção acontecer.

Esse descasamento não se resolve vendendo mais — **vender mais o agrava**, porque cada contrato novo exige material antes de gerar caixa. Resolve-se com **capital de giro**, com **revisão da escala de pagamento dos contratos** e com a **medição que este documento ainda não tem**.
